


Informe de cumplimiento del proyecto financiados con el Fondo para la Accesibilidad para las personas con discapacidad.
Gobierno de la Ciudad de México / Sistema de Transporte Colectivo


Proyecto integral (séptima etapa) para resolver la accesibilidad a personas con discapacidad a base de elevadores en estaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo
Enero-septiembre 2018

| N° de componente | Descripción | Instancia ejecutora | Avance físico | | | Costo unitario con IVA | Avance financiero (Pesos) | | | Proveedor(es) | Resultados obtenidos |
|------------------|-------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|------------------|------------------|---|--|
| | | | Meta | | Unidad de medida | | Recurso federales | | | | |
| | | | Programada total | Avance alcanzado | | | Autorizado | Comprometido | Ejercido | | |
| 1 | Elevadores | Sistema de Transporte Colectivo | 10.0 | 10 | pieza | \$ 3,122,909.81 | \$ 31,564,598.62 | \$ 31,553,737.07 | \$ 31,553,737.06 | 1. Spahilli Construcciones e Instalaciones, S.A. de C.V. 2. Platino Ingeniería, S.A. de C.V. 3. Sinergman, S. de R.L. de C.V. | Los trabajos fueron ejecutados en la modalidad de Proyecto Integral y consistieron en las actividades principales siguientes: 1. Elaboración de Estudios y Proyectos. 2. Fabricación y montaje de 10 elevadores. 3. Construcción de cubos de elevadores, desvío de interferencias, adecuaciones de infraestructura, instalaciones eléctricas y electrónicas y colocación de señalética, en las estaciones La Raza (1 elevador) y Politécnico (3 elevadores) de Línea 5; El Rosario Línea 6 (2 elevadores); El Rosario Línea 7 (2 elevadores); y Oceanía Línea B (2 elevadores). |
| 2 | Rampas | | 10.0 | 1 | pieza | \$ 32,463.90 | | | | | |

ELABORÓ


 Ing. David Reynaga Serrato
 Subgerente de Obras y Mantenimiento

AUTORIZÓ


 Ing. Alejandra Flores Saldivar
 Gerente de Obras y Mantenimiento


PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS FEDERALES

Situación del 31 de diciembre de 2018

I. FONDO DE ACCESIBILIDAD (FOTRADIS)

Los trabajos corresponden al Proyecto de Inversión denominado "Proyecto integral (séptima etapa) para resolver la accesibilidad a personas con discapacidad en estaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo", con un importe total comprometido de \$31'553,737.06 (Treinta y un millones quinientos cincuenta y tres mil setecientos treinta y siete pesos 06/100 M.N.)

Para el cumplimiento de las metas establecidas en la etapa de planeación de los trabajos, fueron realizados dos procedimientos de Licitación Pública y un procedimiento de Invitación Restringida, mediante los cuales se adjudicaron los contratos indicados en la tabla siguiente, en la cual se señalan los avances alcanzados al 31 de diciembre de 2018. Los trabajos dieron inicio el 11 de septiembre de 2017, en el caso del contrato SDGM-GOM-2-21/17, y el 18 de septiembre del mismo año, en el caso de los dos contratos restantes.

CONTRATOS CELEBRADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA SÉPTIMA ETAPA DE INSTALACIÓN DE ELEVADORES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN ESTACIONES DE LA RED DEL METRO

| Contrato No. | Objeto | Contratista | Importe en pesos con IVA | | |
|---------------------|---|--|--------------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | Asignación 2017 | Avance real | Periodo de ejecución programado |
| SDGM-GOM-IR-2-05/18 | Proyecto integral (séptima etapa) para resolver la accesibilidad a personas con discapacidad a base de 2 (dos) elevadores en la estación Oceanía de la Línea B de la Red del S.T.C. | Spahilli Construcciones e Instalaciones Electromecánicas, S.A. de C.V. | \$ 6,308,080.00 | 100% | 21-may-18 al 17-nov-18 |
| SDGM-GOM-LP-2-06/18 | Proyecto integral (séptima etapa) para resolver la accesibilidad a personas con discapacidad a base de 4 (cuatro) elevadores en estaciones de la Línea 5 de la Red del S.T.C. | Platino Ingeniería, S.A. de C.V. | \$12,598,657.07 | 100% | 01-jun-18 al 30-nov-18 |
| SDGM-GOM-LP-2-07/18 | Proyecto integral (séptima etapa) para resolver la accesibilidad a personas con discapacidad a base de 4 (cuatro) elevadores en estaciones de las Líneas 6 y 7 de la Red del S.T.C. | Sinergman, S. de R.L. de C.V. | \$12,646,999.99 | 100% | 01-jun-18 al 30-nov-18 |
| Totales | | | \$31,553,737.06 | 100% | |


El alcance de los contratos comprendió la ejecución de las actividades siguientes:

- Realización de Estudios, incluyendo trabajos de campo y de gabinete.
- Elaboración del Proyecto Ejecutivo (Arquitectónico, Estructural y de Instalaciones Diversas).
- Trabajos de instalaciones eléctricas, desvíos de interferencias y construcción de la obra civil necesaria para la instalación de 10 elevadores.
- Adecuaciones de la infraestructura existente y construcción de rampas para garantizar el libre desplazamiento de los usuarios con discapacidad, incluyendo la instalación de barandales.
- Fabricación e instalación de 10 elevadores.
- Instalación de señalamientos suficientes para orientar a los usuarios con discapacidad en su tránsito dentro de las estaciones.
- Elaboración y entrega de documentos técnicos, requeridos para la operación y el mantenimiento de los elevadores
- Conexión de los elevadores, así como las pruebas de operación de los mismos.


Los trabajos fueron ejecutados en las estaciones indicadas a continuación:

UBICACIÓN DE LOS ELEVADORES INSTALADOS 7ª. ETAPA

| Contrato No. | Línea | Estación | Cantidad de elevadores |
|---------------------|-------|-------------|------------------------|
| SDGM-GOM-IR-2-05/18 | B | Oceanía | 2 |
| SDGM-GOM-LP-2-06/18 | 5 | La Raza | 1 |
| | | Politécnico | 3 |
| SDGM-GOM-LP-2-07/18 | 6 | El Rosario | 2 |
| | 7 | El Rosario | 2 |
| Total | | | 10 |




ANEXO FOTOGRAFICO

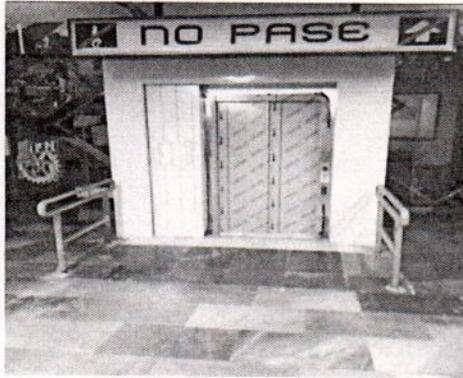

Estación Politécnico Línea 5



Estación Oceanía Línea B

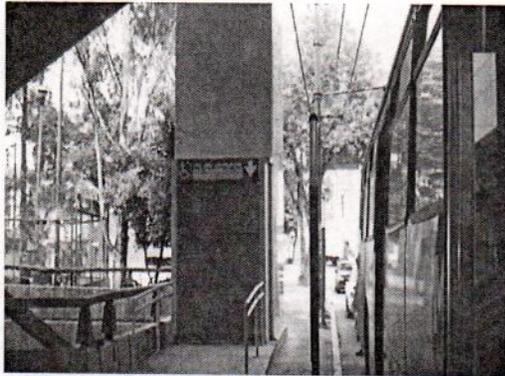

Estación El Rosario Línea 6



Estación El Rosario Línea 6



Estación El Rosario Línea 7

